Эксплуатационный паспорт

на контейнер скважинный погружной с ингибитором АСПО

Заказчик_____

Месторождение_____

Куст _____ Скважина _____

Дата спуска ____. _____._____

Установленные секции контейнера:

Таблица 1

№ п/п	Серийный номер секции	Количество открытых дозировочных отверстий
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

Настройка и спуск контейнера произведены:
Организация_____
Ответственный:
Должность_____ Подпись_____/_____/

Таблица 2

Параметры скважины	Дебит Q		куб.м
	Обводненность		%
	Мехпримести (КВЧ)		мг/л

Таблица 3. «Экономичный режим расхода реагента»

Показатели по скважине		*Расположение*	***Рекомендуемое количество удаляемых регулировочных болтов с каждой секции контейнера***
$Q_{ж}$ м^3/сут	*МРП до применения «ПСК», сутки*		
<30	<30	*Верхние болты*	***1***
		Нижние болты	***3***
	30-100	*Верхние болты*	***2***
		Нижние болты	***2***
	>100	*Верхние болты*	***1***
		Нижние болты	***2***
30-70	<30	*Верхние болты*	***2***
		Нижние болты	***2***
	30-100	*Верхние болты*	***1***
		Нижние болты	***2***
	>100	*Верхние болты*	***1***
		Нижние болты	***1***
70-100	<30	*Верхние болты*	***1***
		Нижние болты	***2***
	30-100	*Верхние болты*	***1***
		Нижние болты	***2***
	>100	*Верхние болты*	***0***
		Нижние болты	***1***
>100	<30	*Верхние болты*	***1***
		Нижние болты	***2***
	30-100	*Верхние болты*	***1***
		Нижние болты	***1***
	>100	*Верхние болты*	***0***
		Нижние болты	***1***

Таблица 4. «Стандартный режим расхода реагента»

Показатели по скважине		*Расположение*	***Рекомендуемое количество удаляемых регулировочных болтов с каждой секции контейнера***
$Q_ж$ м^3/сут	*МРП до применения «ПСК», сутки*		
<30	<30	*Верхние болты*	***3***
		Нижние болты	***4***
	30-100	*Верхние болты*	***3***
		Нижние болты	***3***
	>100	*Верхние болты*	***2***
		Нижние болты	***2***
30-70	<30	*Верхние болты*	***2***
		Нижние болты	***3***
	30-100	*Верхние болты*	***2***
		Нижние болты	***2***
	>100	*Верхние болты*	***1***
		Нижние болты	***2***
70-100	<30	*Верхние болты*	***2***
		Нижние болты	***2***
	30-100	*Верхние болты*	***1***
		Нижние болты	***2***
	>100	*Верхние болты*	***1***
		Нижние болты	***1***
>100	<30	*Верхние болты*	***2***
		Нижние болты	***2***
	30-100	*Верхние болты*	***1***
		Нижние болты	***2***
	>100	*Верхние болты*	***0***
		Нижние болты	***1***

Примечания к таблице 3 и 4:

Так же рекомендуется удалять все регулировочные болты в случае, когда контейнер используется для защиты ЭЦН (в начальный период работы) при вводе скважины в эксплуатацию после бурения или ГРП.

При сборке каждой секции перед ее спуском в скважину при необходимости удалить регулировочные болты М10. Зависимость регулировочных болтов, которые удаляются с каждой секции контейнера, от параметров работы скважины приведена в таблице 3 и 4.

Технологическими службами может приниматься решение об удалении количества регулировочных болтов согласно таблицам 3,4 и не соответствующего табличным данным, а также использования различного количества секций контейнера, исходя из практических наблюдений за работой скважины.

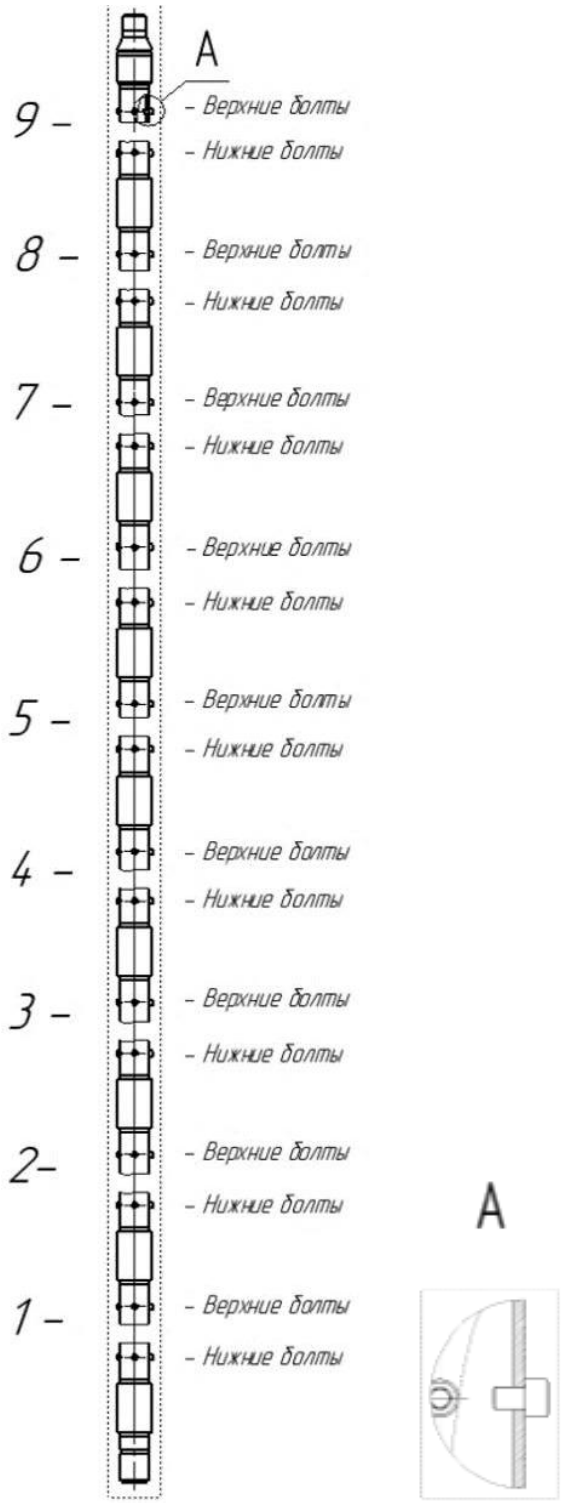

Порядок сборки:
Очередность сборки промежуточных труб в контейнере отсутствует. Верхняя труба комплектуется переводником П73х60 устанавливается последней из труб контейнера.

Утверждено:

Генеральный Директор ООО «НЕФТЕГАЗХИМ» _____Бызов А.Ю.

Дата введения 02.09.24 г.
